



सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

आगरा बैराज परियोजना

बैराज निर्माण खण्ड-प्रथम
आगरा

बैराज निर्माण खण्ड-द्वितीय
आगरा

प्रस्तावित आगरा बैराज के विषय में संक्षिप्त नोट

आगरा शहर की पेयजल समस्या के निदान हेतु आगरा बैराज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। यह परियोजना वर्ष 1997 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ₹0 13408 लाख (वर्ष 1997 की दरों पर आधारित) की स्वीकृत की गई थी। परियोजना उ0प्र0 शासन, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं मिशन मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा भी स्वीकृत है, तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से इसे राज ट्रिपॉजियम जोन निधि के अन्तर्गत रखा गया है।

राज्य व्यय वित्त समिति द्वारा वर्ष 1997 की दरों के आधार पर ₹0 12047 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है। भारत सरकार की व्यय वित्त समिति द्वारा भी परियोजना दि0 13.02.2001 को ₹0 12047 लाख की स्वीकृत कर दी गई है।

वर्ष 2000-2001 में परियोजना पर ₹0 1000 लाख का आवंटन एवं 31 मार्च 2001 को साख सीमा प्राप्त हुई थी, जिसका पूर्ण उपयोग भूमि अध्याप्ति हेतु अपर निलम्बिकारी 70/अ0 की भाँग के अनुसार अग्रिम भुगतान ₹0 390 लाख, गेटों के निर्माण हेतु रिंसाई कार्यशाला बरेली को अग्रिम भुगतान ₹0 436 लाख, सैन्ड्रेज चार्ज ₹0 125 लाख प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य, मृदापरीक्षण, बोर्डहोल एवं एप्रोच रोड, स्टोर के निर्माण हेतु ₹0 49 लाख के रूप में किया गया है। मुख्य बैराज के निर्माण कार्य हेतु प्री-क्वालीफिकेशन निविदायें भी आमंत्रित की गईं। प्राप्त निविदाओं में से गुणवत्ता के आधार पर 9 निविदादाताओं का चयन कर लिया गया है। निविदा प्रपत्र विधिविहित होने हेतु उ0प्र0 शासन न्याय विभाग को प्रेषित किया गया है। अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

वर्ष 2002 में परियोजना पर ₹0 500 लाख का आवंटन एवं साख सीमा प्राप्त हुई। जिसका पूर्ण उपयोग भूमि अध्याप्ति हेतु अग्रिम ₹0 291 लाख, आवासीय भवन एवं फील्ड होस्टल के निर्माण, मृदा परीक्षण, बोर्ड होल एवं अन्य टैस्ट के कार्यों हेतु किया गया। इस प्रकार 1500 लाख रुपये को निम्न प्रकार व्यय किया है—

1. भूमि अध्याप्ति हेतु अग्रिम भुगतान	681.00	लाख
2. बैराज के गेटों के निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान	436.00	लाख
3. सेन्टेज चार्ज	125.00	लाख
4. कार्यों पर व्यय	258.00	लाख
	<hr/>	
	कुल योग	1500.00 लाख

उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रगति में थी इन्हीं बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.8.2001 को वर्ष 1999 में दी गयी पर्यावरण स्वीकृति निलम्बित कर दी गयी तथा बैराज निर्माण में पूर्व और कुछ अन्य परीक्षण कराने का आदेश दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आगरा बैराज के निर्माण कार्य को निलम्बित करने का मुख्य कारण आई(आईटी) कानपुर के प्रोफेसर डा० विधिन दत्ता द्वारा वर्ष 1997 में आगरा बैराज पर दी गयी पर्यावरण रिपोर्ट के उस पैरा को आधार बनाया गया है, जिसमें यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि बैराज के निर्माण से नदी के डाउन स्ट्रीम में भूगर्भ जल स्तर की गुणवत्ता खराब होने की संभावना है। जबकि इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए वर्ष 1999 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आगरा बैराज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके साथ-साथ उनके द्वारा सम्बन्धित ताजमहल के आस-पास पानी की कमी को भी निलम्बन का एक कारण माना गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में सिंचाई विभाग द्वारा डा० विधिन दत्ता से जो उस समय डेनमार्क में थे, ई-मेल द्वारा सम्पर्क कर रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें डा० दत्ता ने स्पष्ट किया है कि आगरा बैराज पर उनकी शोध रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण नहीं है तथा पानी की गुणवत्ता सुधारने हेतु उनके द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है जिससे कि आगरा बैराज के निर्माण के दौरान प्रयोग में लायेंगे। तथा और कुछ अन्य परीक्षण उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। ताजमहल के निकट पानी उपलब्ध रहने की लिए ताज बैराज प्रस्तावित है। अतः पानी की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के सुधार हेतु समाधान उपलब्ध है। गुणवत्ता के सुधार हेतु डा० दत्ता के मॉडल को क्रियान्वित किया जाना एवं जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु ताज बैराज प्रस्तावित है।

उक्त आधार पर तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा आगरा बैराज की स्वीकृति हाइड्रोलोजी के आधार पर सिंचाई विभाग ने एक विस्तृत रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय

नई दिल्ली को पत्रांक 10786/दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रेषित की है। विरो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को टिप्पणी हेतु जनवरी 2002 में भेजा गया है। केन्द्रीय जल आयोग में सिंचाई विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु बराबर प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु अभी तक केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आख्या केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नहीं प्रेषित की गयी है। सिंचाई विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	सम्पर्क का दिनांक	सम्पर्क करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद	सम्पर्क स्थापित किये गये अधिकारी का पद एवं कार्यालय का नाम
1.	15.11.2001	अधी०अभि०बै०ने०मं० आगरा एवं अधी०अभि०बै०नि०ग्र-।आगरा	अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली
2.	12.12.2001	अधी०अभि०बै०नि०मं० आगरा एवं अधी०अभि०बै०नि०ख-।आगरा	अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली
3.	06.3.2002	अधी०अभि०बै०नि०ख-।आगरा	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।
4.	27.3.2002	अधी०अभि०बै०नि०ख-।आगरा	अतिरिक्त निदेशक, पर्यावरण मंत्रालय एवं निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।
5.	13.5.2002	अधी०अभि०बै०नि०ख-।आगरा	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग एवं राज्य अपर यमुना बोर्ड, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली।

6.	27.5.2002	अधि०अभि०बै०नि०मं०-आगरा	निदेशक, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली।
7.	09.7.2002	अधि०अभि०बै०नि०मं०-आगरा	निदेशक, के.डी.ए. केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
8.	22.8.2002	अधि०अभि०बै०नि०ख०-1 आगरा	डिप्टी डायरेक्टर, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
9.	26.8.2002	अधि०अभि०बै०नि०मं० आगरा एवं अधि०अभि०बै०नि०ख०-1 आगरा	मुख्य अभियन्ता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

उपरोक्त के अतिरिक्त केंद्रीय जल अयोग एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को निम्नलिखित पत्र भी लिखे गये हैं—

क्र०सं० पत्रांक

सम्बोधित अधिकारी का नाम एवं कार्यालय का पता

1. अधि०अभि०बै०नि०मं०, आगरा का पत्रांक 2386/दिनांक 04.4.2002

डा० बी०बै० चावला, निदेशक को०अ०आ० नई दिल्ली।

2. अधि०अभि०, बै०नि०मं०, आगरा का पत्रांक 1484/दिनांक 14.5.2002

डा० ए०ए० भौमिक, अतिरिक्त निदेशक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली।

3. अधि०अभि०, बै०नि०ख०-1, आगरा का पत्रांक 1313/दिनांक 11.7.2002


डा० एस०के० श्रीवास्तव, निदेशक एवं पी (नार्थ) केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली।

4. अधी०अभि०, वै०नि०मं०, आगरा का पत्रांक
6221/दिनांक 17.7.2002

डा० एस० भौमिक, अतिरिक्त
निदेशक केन्द्रीय पर्यावरण
मंत्रालय, नई दिल्ली।


उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय जल अयोग के अधिकारियों से नियमित रूप से दुरभाष पर सम्पर्क भी किया जाता रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपनी आख्या, चेयरमैन, केन्द्रीय जल अयोग नई दिल्ली को दिनांक 23.9.2002 को प्रेषित की जा चुकी है। इस बीच केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है परन्तु अभी तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस विषय में अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण मंत्रालय से निरन्तर सम्पर्क किया जाता रहा है। दिनांक 15.01.2003 को उनके साथ हुई बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि डा० विथिन दसा प्रोफेसर आई०आई०टी० कानपुर से पुनः सम्पर्क कर पानी की गुणवत्ता के विषय में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा जल निगम द्वारा यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रेषित की जावे। जिससे निलम्बन से मुक्ति हेतु अन्तिम निर्णय लिया जा सके। वर्तमान में आगरा बैराज परियोजना को दिनांक 12.10.2002 की मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड की आगरा में हुई बैठक में लिये निर्णय के अनुसार टी०टी०जं० से अलग कर दिया गया है, तथा पर्यावरण की स्वीकृत बहाल होने पर इसके वित्त पोषण की समस्या का समाधान भी आवश्यक होगा।

यदि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पुनः प्रदान कर दी जाती है तो पारयोजना पर वर्ष 2002-03 में प्रारम्भिक रूप से भूमि की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि लगभग 90 हेक्टेअर भूमि के अध्याप्ति के प्रस्ताव कि०भू०अ०अ० आगरा प्रेषित किये जा चुके हैं परन्तु अभी धारा 4 एवं धारा 17 की कार्यवाही होनी है जिसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि प्राप्त होने पर ही निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हो पायेगी।


31/1/03

अधिशाली अभियन्ता
बैराज निर्माण खण्ड-1,

आगरा


31/1/03

अधीक्षण अभियन्ता
बैराज निर्माण मण्डल,

आगरा

आगरा बैराज पर मार्च / 2002 तक मदवार व्यय का विवरण


मद	धनराशि (लाख रु. में)
1- भूमि अध्याप्ति हेतु ए0डी0एम0को अग्रिम	681.00
2- भेटों के निर्माण हेतु सिंघाई कार्यालया उंड बरेली को अग्रिम भुगतान	436.00
3- स्टीज चार्ज का ट्रेजरी में भुगतान	125.00
योग :-	1242.00

कार्यों पर व्यय

1- प्रोजेक्ट प्राविधान के अनुसार आंशिक संख्या में आवासों का निर्माण 36 सं० एवं एक फील्ड हॉस्टल का निर्माण	103.00
2- एप्रोच रोड {2 कि०मी०} कार्य स्थल पर	19.32
3- आई०आर०आई०रुड़की को भुगतान	15.32
4- स्टोर का निर्माण	14.32
5- विभिन्न प्रकार के मुदा परीक्षण-77 सं० बर होल 6" डायमीटर 2 सं० परमिटेबिलिटी टेस्ट एवं 2 सं० प्लेट लोड टेस्ट	67.92
6- सिंघाई निर्माण खण्ड-ओखला को निर्माण सामग्री एवं स्टोर के लिए अग्रिम भुगतान	20.15
7- नलकूप खंड-आगरा को कालोनी में वाटर सज्जाई हेतु बोरिंग एवं अन्य कार्यों हेतु अग्रिम	12.22
8- चंका डाल नहर खंड-फिरोजाबाद को बिजली टिका भुगतान हेतु	1.15
9- ओ-मिलेनियस जीप वाहन, कार्यालय व्यय एवं अन्य आकारिगत व्यय	4.60

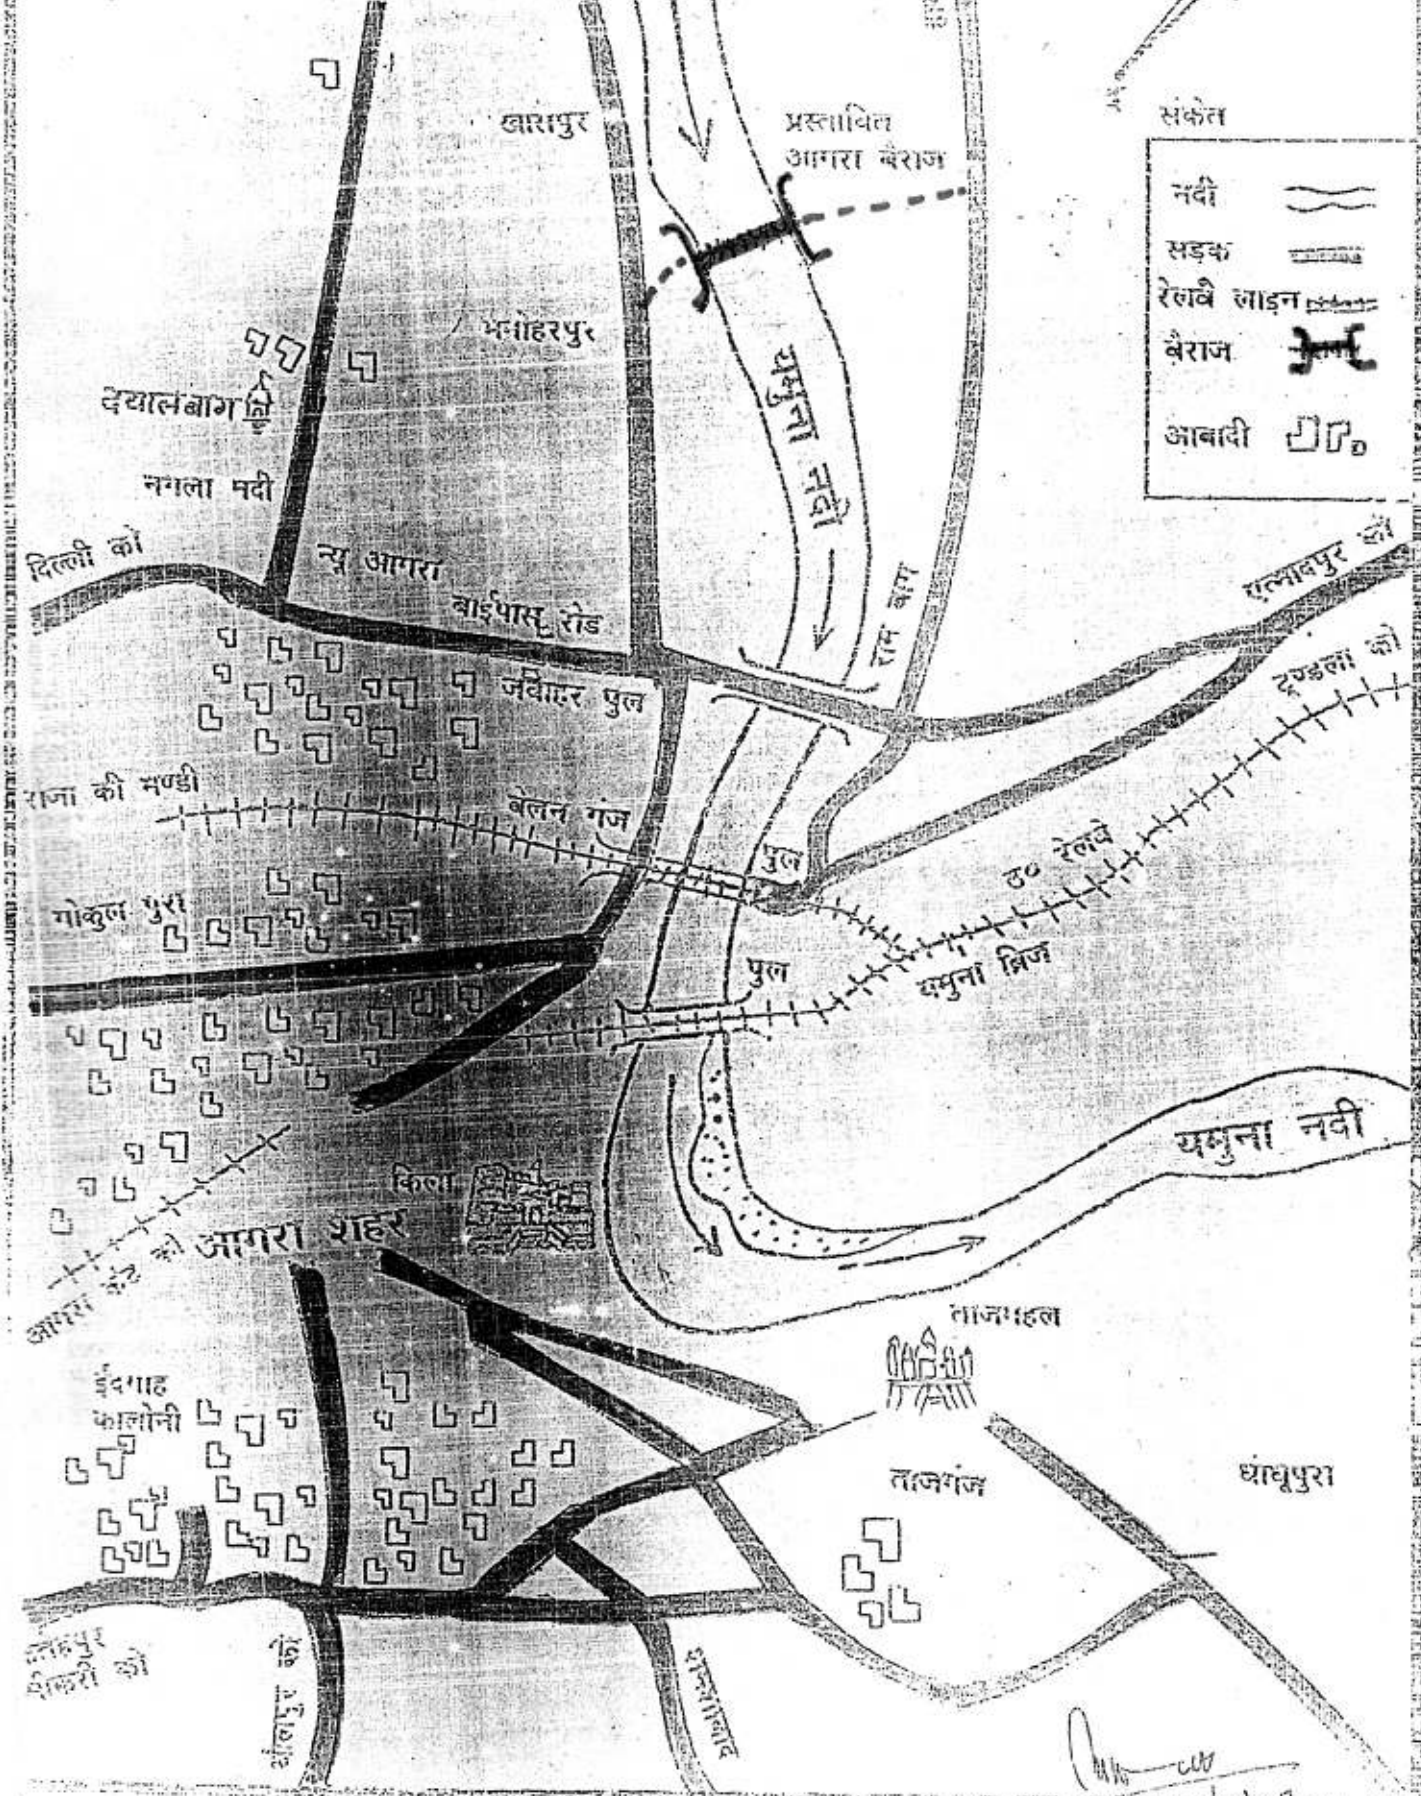
योग:- 258.00

कुल योग:- 1500.00 (लाख)


 20/11/03
 बैराज पर मार्च / 2002 तक
 आगरा

सांकेतिक मानचित्र

आगरा बैराज आगरा



संकेत

नदी	~~~~~
सड़क	=====
रेलवे लाइन	-----+-----
बैराज	⌌⌌⌌
आबादी	□□□

[Handwritten signature]
20/1/03

आगरा शहर की आबादी
